


施工事例報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2011/9/30
ソーラー	鉄道駅舎リニューアル工事	作成者

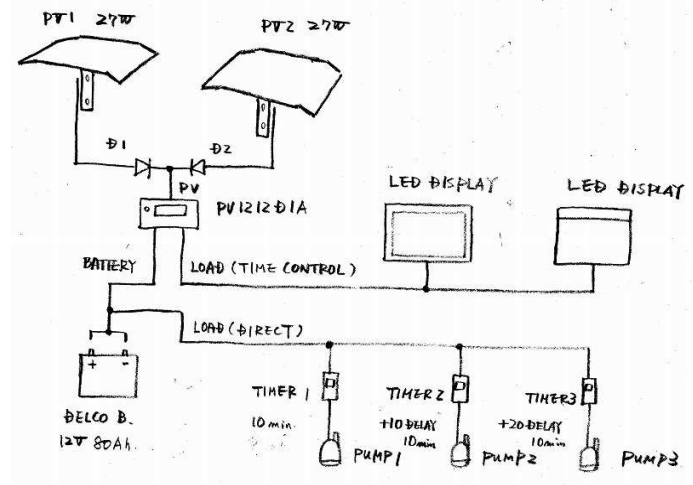

No.	特 記 事 項
1	電源は、太陽電池モジュール(27W) x 2枚 で発電、12V 80Ah/バッテリー x 1に充電する構成とした。
2	太陽電池の取り付け角度は60度。
3	本年秋分(9月26日晴れ)AM11:00時点で、充電電流2.6A(1枚あたり1.3A)を確認。
4	
5	LED看板(400x600)消費電力 約12wを日没から、翌朝日の出まで点灯制御。
6	さらに、植栽棚 x 2台の灌水 1日2回(AM8:00から10分、PM4:00から10分)の電源としている。
7	2011年 3月15日設置
8	
9	
10	
