


施工報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2012.02.10
ソーラー	駅前再開発現場にソーラーシステム	

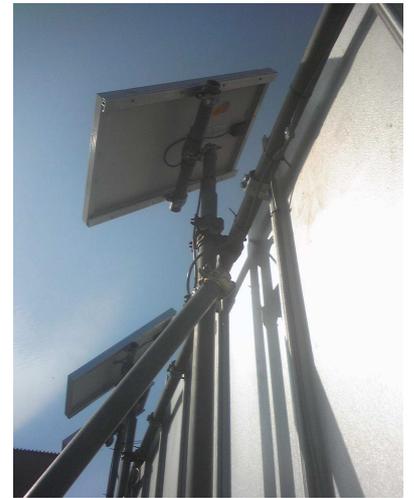

No.	特 記 事 項
1	駅前再開発、大規模な施設建設の現場。
2	光触媒コート仮囲いNKタウンキャンパスの上部にLED看板(400mm x 400mm 12V12W)4枚で安全第一を表示した。
3	240W(60W x 4枚)太陽電池パネル、充電コントローラー、バッテリー200Ah(12v 100Ah x 2)の構成とした。
4	太陽電池パネルは現場の単管にクランプ止め。簡単に、迅速に設置ができる。
5	コントローラーで発電量を監視し、日没後6時間の自動点灯とした。
6	
7	ソーラーシステムの電力は携帯電話の充電や照明など非常事態のバックアップ電源として有効に活用できます。
8	
