


<b>施工報告書</b>		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2013. 07. 09
NKミスト 分離型	マンション建設工事	

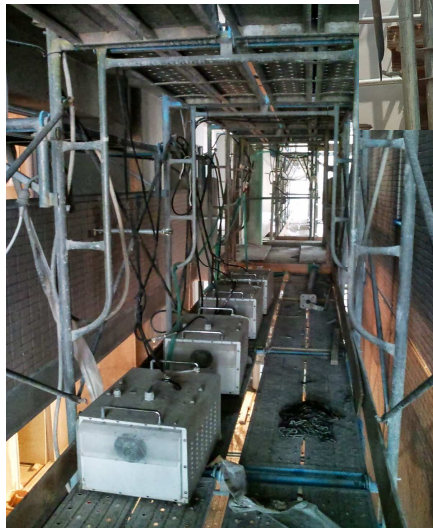

No.	特 記 事 項
1	ポンプユニット 4台を 9階部分に設置、ファンヘッドは 13階の配筋、型枠作業現場に 4基取り付け。
2	ハイウォッシャーからの高圧水を一旦500Lのタンクで受水し、建枠一枠分の落差でポンプへ給水。
3	ところが、3台までは稼働するが4台目が圧力が上がらず、ミストが出ない。
4	結局、タンクから分岐管までの配管の口径が細く、2L/分 x 4台の必要流量が流せていないのが原因だった。
5	
6	配管口径を大きくし、流量の確保が必要だった。
7	
8	
