
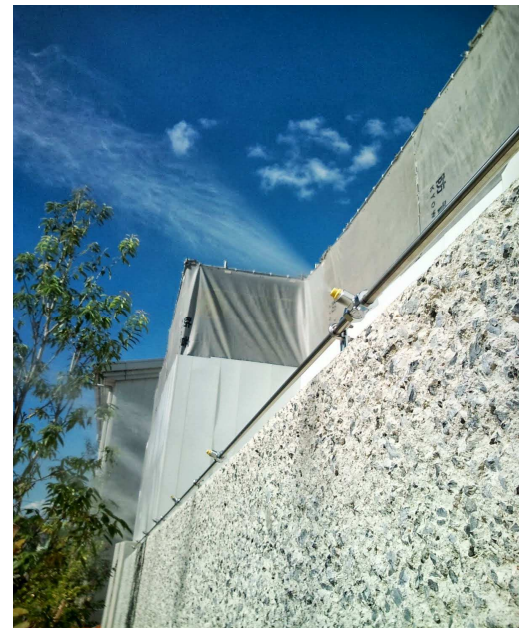


施工事例報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2013. 08. 27
NKミスト パイプ式	大規模集合住宅新築工事のミストと壁面緑化	

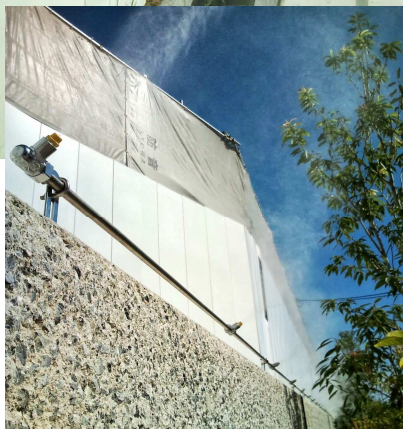

No.	特 記 事 項
1	四方を仮囲いで囲われた造成地内はA街区からD街区にわかれ、最終的には13棟の集合住宅が建設される。
2	その開発地の西面、歩道と接する延長230メートルにパイプ式ミストを設置した。
3	現場入り口のゲートをはさんで南側80メートルは、3mの仮囲いの上面にL字金具を取り付けパイプをUボルトで固定。
4	南側120mはコンクリート擁壁の上面にL字金具を立て、ステンレスパイプ配管をUボルトで固定した。
5	ノズルピッチは1m。全部で5台のポンプユニットを使用した。
6	擁壁と歩道との間に約1mの植栽帯があり、そこを通り抜けるミストが柔らかな涼風となる空間を創り出した。
7	
8	この西面の囲いにはNKみどりのキャンバス 13棚も同時に設置した。
