| 施工報告書 | | 作　成　日　付 |
|---|---|---|
| カテゴリー | 工　　事　　名　　称 | 2014.12.25 |
| ＮＫミスト　パイプ型 | ＮＫミストで粉じん対策 | |

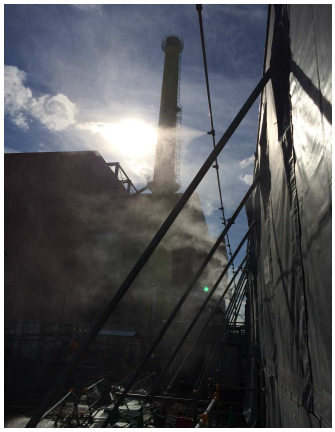

| Ｎｏ． | 特　記　事　項 |
|---|---|
| 1 | ゴミ処理工場の建て替え工事。工期４年 |
| 2 | 現在２シーズン目の冬。 |
| 3 | 設置後1年半。工事期間中、毎日休まず稼働している。 |
| 4 | 大規模な基礎工事が連日続いている。 |
| 5 | 重機による掘削作業、ダンプカーで廃土の搬出など粉じんは季節とは関係ない。 |
| 6 | 凍結によるノズル及び配管の破損を予防するために、毎日水抜きを行ってもらっている。 |
| 7 | |
| 8 | |
| | |
